ayming | ALSTOM • mobility by nature •

Cotizaciones AT/EP y pagos delegados

Propuesta de servicios de consultoría para Alstom España. Revisión, recuperación y defensa ante la Tesorería General de la Seguridad Social.



Índice

01 **Visión general de la misión**
Las dos áreas de estudio y cómo las abordamos

02 **Fases clave del proyecto**
Dos fases, seis etapas y sus entregables

03 **Arranque de la misión y detalle de las etapas**
Documentos, plataforma, calendario y dedicación de Alstom

04 **Oferta económica**
Honorarios exclusivamente a éxito

ayming | CONFIDENCIAL · Documento propiedad exclusiva de Ayming

ayming

01

Visión general de la misión

Las dos áreas de estudio y cómo las abordamos



Dos áreas de estudio

Dos mecánicas distintas, un mismo conjunto de datos.

ÁREA 1

Tipos de cotización AT/EP

El objetivo: declarar la clasificación correcta y cotizar lo justo, corrigiendo las desviaciones tanto al alza como a la baja.

Conformidad. El tipo depende de la actividad de la empresa (CNAE) y de la ocupación real de cada empleado, y la ocupación real prevalece.

Ahorro. Una ocupación clasificada por encima de su riesgo real cotiza de más; corregirla baja el tipo y permite recuperar lo pagado.

1,50 %	←	3,85 %	→	6,70 %
Oficina exclusiva (clave a)		Tipo de la actividad de la empresa		Instalaciones y reparaciones (clave d)

La ocupación real de cada empleado corrige el tipo en ambos sentidos.

ÁREA 2

Pagos delegados de incapacidad temporal

La empresa **adelanta la prestación** y la deduce de su liquidación hasta el reintegro efectivo. La línea muestra, por días de baja, qué recupera y qué soporta.

ENFERMEDAD COMÚN · DÍAS DE BAJA

1 a 3	4 a 15	16 a 20	Desde el 21
Sin prestación	60 %, coste empresa	60 %, coste INSS/Mutua	75 %, coste INSS/Mutua

ACCIDENTE Y EP · DÍAS DE BAJA

Día 1	Desde el día 2
Salario íntegro	75 %, coste INSS/Mutua, sin carencia

El porcentaje es la prestación de IT sobre la base reguladora. El coste INSS/Mutua se adelanta en pago delegado y se recupera de la liquidación.

ÁREA 1

Tipos de cotización AT/EP

Cartografía de actividades

Analizar las prácticas de Alstom e identificar las actividades realmente desarrolladas en cada centro.

Mapping de ocupaciones

Identificar las ocupaciones del Cuadro II que pueden dar lugar a un tipo AT/EP específico distinto del derivado del CNAE.

Cuantificación del impacto

Comparar el tipo efectivamente aplicado con el que habría correspondido y cuantificar las sobrecotizaciones históricas y el ahorro futuro.

Solicitud y regularización

Preparar las solicitudes de devolución y regularización ante la Seguridad Social, con soporte documental.

Seguimiento de solicitudes y litigios

Seguir las resoluciones administrativas o judiciales hasta su ejecución efectiva, coordinando las actuaciones con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



ÁREA 2

Pagos delegados de incapacidad temporal

Identificación del perímetro

Identificar todas las situaciones de IT del periodo no prescrito, con carácter general hasta los últimos 4 años.

Clasificación de prestaciones

Clasificar cada expediente según su contingencia y determinar el periodo de pago delegado y el importe asociado.

Conciliación y cuantificación

Comparar los importes abonados por Alstom en pago delegado con los efectivamente compensados en las liquidaciones de cotizaciones.

Recuperación de importes

Presentar las solicitudes de reintegro ante la entidad competente, con la documentación justificativa y el seguimiento hasta su resolución.

Materialización y litigios

Materializar los reintegros tras la resolución, coordinando con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



ayming

02

Fases clave del proyecto

Dos fases, seis etapas y sus entregables



Fases

FASE A · Diagnóstico y cuantificación

FASE A1 · WP1
Encuadre
2 semanas

- Recolección de la documentación necesaria
- Perímetro
- Plan de trabajo
- Calendario

ENTREGABLES
Listado de documentación
Plan de proyecto y etapas

FASE A2 · WP2
Diagnóstico
2 semanas

- Revisión de las prácticas actuales
- CNAE aplicado
- Tipos AT/EP
- Cotizaciones abonadas
- Pagos delegados de IT

ENTREGABLES
Informe de evaluación jurídica y técnica
Resumen de riesgos

FASE A3 · WP3
Validación
4 semanas

- Determinación de los cambios adecuados
- Códigos CNAE apropiados
- Revisión de las ocupaciones
- Detección de prestaciones de IT no compensadas

ENTREGABLES
Informe de análisis de clasificación y prestaciones de IT
Documentación de justificación técnica

FASE A4 · WP4
Cuantificación
2 semanas

- Cálculo de las sobrecotizaciones y de los importes recuperables, tanto en AT/EP como en pagos delegados de IT

ENTREGABLES
Informe de revisión de cotizaciones
Listado de regularizaciones identificadas

FASE B · Regularización y recuperación

FASE B5 · WP5
Regularización
2 semanas

- Presentación de las solicitudes y defensa ante los organismos competentes

ENTREGABLES
Escritos jurídicos listos
Informe sobre los procedimientos

FASE B6 · WP7
Recuperación
Según la administración

- Seguimiento hasta la recuperación efectiva de los importes
- Resolución amistosa en caso de contestación o acción contenciosa, pilotada por el despacho de abogados asociado

ENTREGABLES
Informe de seguimiento de recuperaciones
Informe periódico de reembolsos
Informe final de resultados

Fase transversal, WP6. Gestión integral del proceso, informes periódicos, transparencia y coordinación entre todos los agentes implicados. Gestión y custodia documental, control de riesgos y cumplimiento normativo. **Fase C,** apoyo de una consultoría especializada.

ayming

03

Arranque de la misión y detalle de las etapas

Documentos, plataforma, calendario y dedicación de Alstom



Documentos necesarios

Lo que necesitamos de Alstom para arrancar cada área del estudio.

EN GENERAL

- Listado de entidades, centros de trabajo y CCC, con CNAE actual e histórico, y de las fusiones, adquisiciones y reorganizaciones que hayan afectado al perímetro analizado
- Maestro histórico de empleados: ID, entidad/CCC, centro, puesto, fechas de alta/baja/cambio de puesto y código de ocupación aplicado
- Extracto de nómina de los 4 últimos años (formato Excel/CSV)
- RLC de cada periodo de liquidación
- Ficheros de cálculos / bases del SLD, si disponibles
- Resolución, acta de inspección, requerimiento o correspondencia de 2019 relacionada con el código CNAE

TIPOS AT/EP

- Descripciones de puestos de trabajo, con sus correspondientes evaluaciones de riesgos laborales
- Documentación de la actividad desarrollada en cada centro: licencias de actividad, descripción de las actividades, documentación PRL, cualquier documento que permita acreditar la separación funcional y operativa de las actividades

PAGOS DELEGADOS DE IT


- Convenios de asociación con Mutuas e histórico de cobertura por CCC, indicando las contingencias cubiertas
- Fichero FIE/FIER si disponible
- Detalle de prestaciones abonadas en pago delegado: trabajador, contingencia, fechas, base reguladora e importe abonado

Ayming Share, su espacio de trabajo seguro

La plataforma en línea segura y colaborativa de Ayming para el intercambio de documentos de la misión.

Compartir y colaborar

- Compartir e intercambiar datos y documentos.
- Comunicarse y colaborar.
- Alertas de nuevas cargas de documentos mediante notificaciones.
- Anticipar las próximas etapas.
- Agilizar los intercambios y la toma de decisiones.

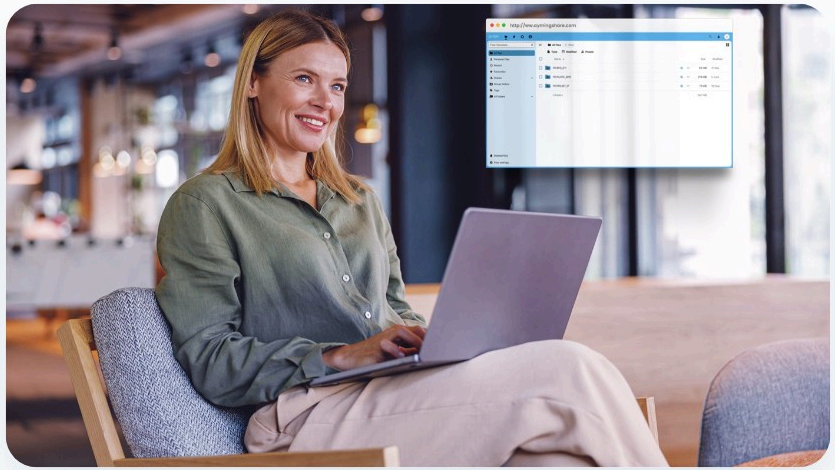

Proteger sus datos

- Alojamiento gestionado por Ayming.
- Acceso mediante usuario, contraseña y captcha.
- Datos cifrados.
- Detección de intentos fraudulentos de acceso.
- Sistema de control de acceso al sitio.

Certificación ISO 27001 sobre la gestión de la seguridad de la información, y alojamiento de datos de salud certificado HDS a través de Ayming Digital.

Calendario y responsabilidades

Dos fases y seis lotes de trabajo, con el entregable de cada etapa, quién lo aporta y su fecha. La gestión transversal cubre toda la misión.

ETAPAS · ENTREGABLES · RESPONSABLES			SEP	OCT	NOV	DIC
Gestión transversal · WP6			Coordinación, informes periódicos y custodia documental a lo largo de toda la misión			
FASE A						
Encuadre	2 semanas					
AMBOS	Kick-off	01.10				
ALSTOM	Transmisión de los documentos necesarios	01.10				
AYMING	Transmisión del plan de trabajo, perímetro y calendario	15.10				
Diagnóstico	2 semanas					
AYMING	Informe de evaluación jurídica y técnica, resumen de riesgos	02.11				
AMBOS	Punto de seguimiento n.º 1, Q&A	09.11				
Validación	4 semanas					
ALSTOM	Complementos de información y clarificación de puestos de trabajo	18.11				
AYMING	Propuesta de reclasificación CNAE y de gestión de las prestaciones de IT	02.12				
AMBOS	Punto de seguimiento n.º 2, Q&A	09.12				
Cuantificación	2 semanas					
AYMING	Informe de revisión de cotizaciones, listado de regularizaciones identificadas	15.12				
FASE B						
Regularización	2 semanas					
AYMING	Escritos jurídicos listos, informe sobre los procedimientos	15.12				
AMBOS	Punto de seguimiento n.º 3, Q&A	18.12				
Recuperación	Según la administración					
AYMING	Informe de seguimiento de recuperaciones y de reembolsos	antes del 31.12				
AYMING	Informe final de resultados	antes del 31.12				

Ayming · Alstom · Ambos, punto de seguimiento y Q&A

La dedicación de Alstom

Lo que pedimos a sus equipos entre octubre y diciembre, etapa por etapa.

INVERSIÓN TOTAL DE ALSTOM

4

días de trabajo

- **Envío de documentos**
  2 días al arranque, 1 o 2 días tras el primer punto de seguimiento
- **Cuatro reuniones**
  Kick-off y tres puntos de seguimiento, 1 hora cada uno

Del 1 de octubre al 18 de diciembre

01.10	REUNIÓN **Kick-off** Acuerdo sobre las fechas de entrega y de reuniones, preguntas adicionales sobre la parte técnica y los documentos necesarios.	1 hora
1.ª semana de octubre	ALSTOM **Juntar los documentos** Envío a través de Ayming Share, con disponibilidad total de Ayming para confirmar la recepción de los documentos, validar su formato y comprobar que no falta ninguna información.	2 días enteros
09.11	REUNIÓN **Punto de seguimiento n.º 1** Q&A sobre el informe remitido previamente, que recoge todas las prácticas en vigor en Alstom, y aclaración de las actividades y los puestos de trabajo si surgieron dudas tras el análisis.	1 hora
Tras el punto n.º 1	ALSTOM **Mandar documentos complementarios** Envío de los documentos adicionales identificados en el punto de seguimiento n.º 1.	1 o 2 días
09.12	REUNIÓN **Punto de seguimiento n.º 2** Acuerdo, comentarios o correcciones sobre las recomendaciones de Ayming, tras la presentación del informe de la misión.	1 hora
18.12	REUNIÓN **Punto de seguimiento n.º 3** Validación de los expedientes de solicitud de reembolso y firma de las solicitudes.	1 hora

ayming

04

Oferta económica

Honorarios exclusivamente a éxito



Oferta económica

Nuestro modelo de remuneración se basa en honorarios de éxito sobre las economías generadas.

Importe total de las economías generadas	% Honorarios
Hasta 500.000 €	20 %
De 500.001 € hasta 1.000.000 €	17 %
De 1.000.001 € hasta 2.000.000 €	14 %
Más de 2.000.000 €	10 %

LOS CINCO ESCENARIOS DEL PLIEGO

Economías realizadas	Honorarios	Valor neto conservado por Alstom
100.000 €	20.000 €	80.000 €
250.000 €	50.000 €	200.000 €
500.000 €	100.000 €	400.000 €
1.000.000 €	185.000 €	815.000 €
2.000.000 €	325.000 €	1.675.000 €

Tipo efectivo decreciente: del 20 % al 16,3 % en el escenario más alto.

Definición de la noción de "economías generadas"

1. Todos los abonos o créditos confirmados por la Administración, así como los importes recuperados por Ayming correspondientes a periodos anteriores.
2. Para las regularizaciones iniciadas por Ayming que generan efectos futuros, la remuneración de Ayming estará limitada al equivalente de 2 años de ahorro.

Por ejemplo: identificamos 1.050 k€ de economías totales para Alstom. La facturación de Ayming sería: 500 × 20 % + 500 × 17 % + 50 × 14 % = 100 + 85 + 7 = 192 k€.

Lo esencial de nuestra propuesta

Listos para empezar

Arrancamos una semana después de la firma.

Antes del 31.12.2026

Todo el perímetro no contencioso cubierto.

Equipos dedicados

Un equipo asignado a sus expedientes, con seguimiento nominativo.

Volumen con calidad

Herramientas propias de conciliación de reembolsos no percibidos.

Una solución ideal

Revisión integral de la clasificación: códigos CNAE y diagnóstico 360º de los puestos, ocupaciones y tipos aplicados, sobre datos históricos y realidad operativa.

Revisión exhaustiva de los pagos delegados de IT, identificando los importes no compensados y las oportunidades de recuperación.

Cuantificación de los importes recuperables y de los ahorros recurrentes.

Gestión completa ante los organismos: solicitudes, requerimientos y defensa administrativa, hasta el reintegro efectivo y la corrección de las parametrizaciones.

Equipo de expertos con dedicación completa y capacidad de movilización inmediata.

Gobernanza clara: reporting periódico, trazabilidad de las posiciones, transparencia sobre los riesgos y herramientas digitales para el intercambio de información.



ayming × ALSTOM · mobility by nature ·

Gracias.

www.ayming.com

Olivier Meynard
omeynard@ayming.com

Ayming España
Paseo de la Castellana 91, planta 13, 28046 Madrid

Ayming International
114 rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret, Francia

